

PLANLAGTE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER HOS HIAS

Trym Edvardsen

Prosjektleder/ byggeleder VA



Sammen om et bedre miljø

Generelt vedr. VA-aktivitet i Hias


- **Heggvin Næringspark:**
 - Hias må i forbindelse med ny planlagt Næringspark på Heggvin prioritere mye ombygginger og oppdimensjoneringer på vannsiden med trykkøker, høydebasseng og ledningsnett
 - Tilsvarende må det bygges om 2 avløpspumpestasjoner og mulig oppdimensjonering av avløpsnett
 - Alt haster veldig og går utover andre planlagte prosjekter
- **Dobbeltporet jernbane Sørli-Åkervika**
 - Forberedende arbeider er i gang med flere prosjekter for Hias, eksempelvis Tokstad prosjektet og vannkryssing nord for Stange stasjon.

Sanering E6 – Arneberg - Vann

- Ny vannledning Ø 300 på et eldre strekk med dårlig ledninger og for liten dimensjon, se rød strek i kartet for ca. ny trasse.
- Fellesprosjekt med Stange kommune
- Prosjektering: FP ferdigstilt og DP oppstart i februar 2023.
- Bygging 2023-2024, utsatt pga. ekspropriering av grunn.
- Budsjett Hias ca. 16 mill.



Midtstranda - Hubred

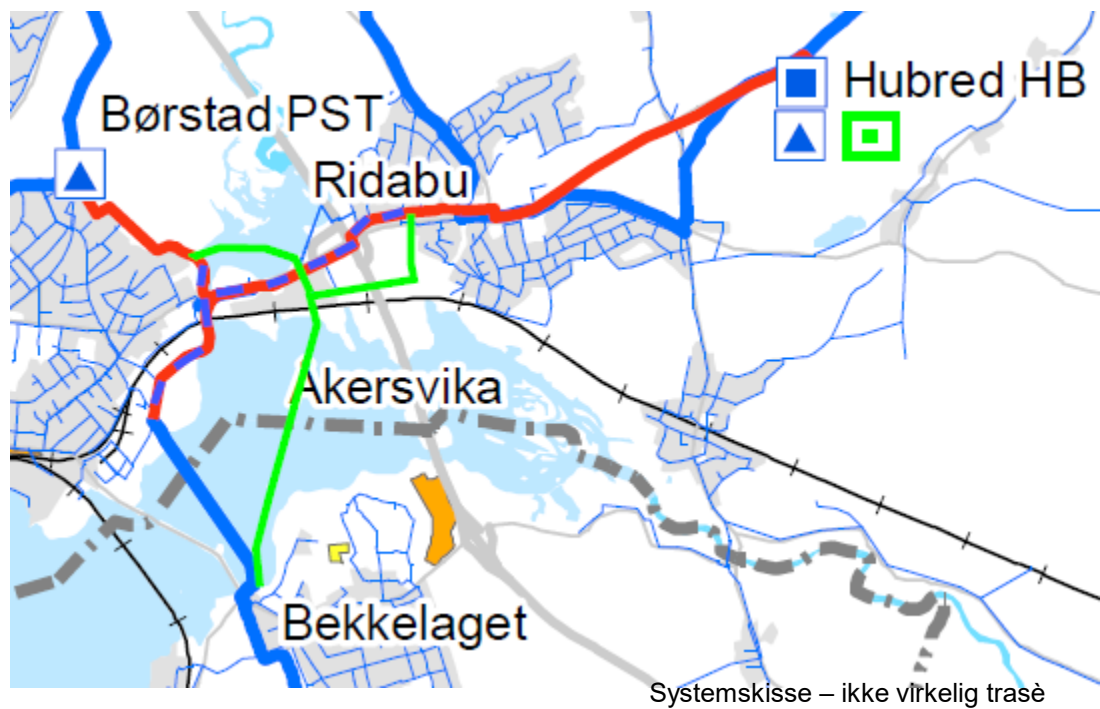


Prosjekt 1 og 2 nødvendig for forsyning fra nytt Hias vba og deling av trykksone i Hamar.
Prosjekt 3, 4 og 5 for å ivareta kapasiteten i systemet.

1. Ledning Midtstranda – Ridabu –(HK/Hias)
 - Entreprise 1 – ferdig
 - Entreprise 2 – ferdig
2. Ledning Midtstranda Bekkelaget
 - Ferdig
3. Ledning Ridabu - Hubred:
 - Fremdrift bygging: Deler av strekningen etappe 2, planlagt 2023/ 2024.
 - Investeringskostnad: Hias del, kr 16,4 mill ekskl. mva. I tillegg kommer Hamar kommunes del, men her har jeg ingen sum pr.d.d.
 - Dimensjon pr nå: DN 400
4. Utvidelse Hubred HB
 - Fremdrift bygging: Etter 2026
 - Investeringskostnad: kr 23,3 mill eks. mva
5. Ledning Midtstranda – Børstad
 - Investeringskostnad: kr 15,1 mill eks. mva
 - Aktuelt etter 2030.

Knyttet usikkerhet til kostnadene, de fleste er på hovedplan nivå.

STYRKE FORSYNING TANGEN

- Sikre tosidig vannforsyning til Gata/Tangen. Gjelder også for avløp.
- Utvikling av Tangen området.
- Skisseprosjekt er ferdigstilt.
- Videre fremdrift for tiltak er avhengig av fremdrift utvikling Tangen. Bygging er pr nå forutsatt etter 2026. Stipulert investering på 136,2 mill.
- Planlagt å bli Hias anlegg når tiltak gjennomføres.

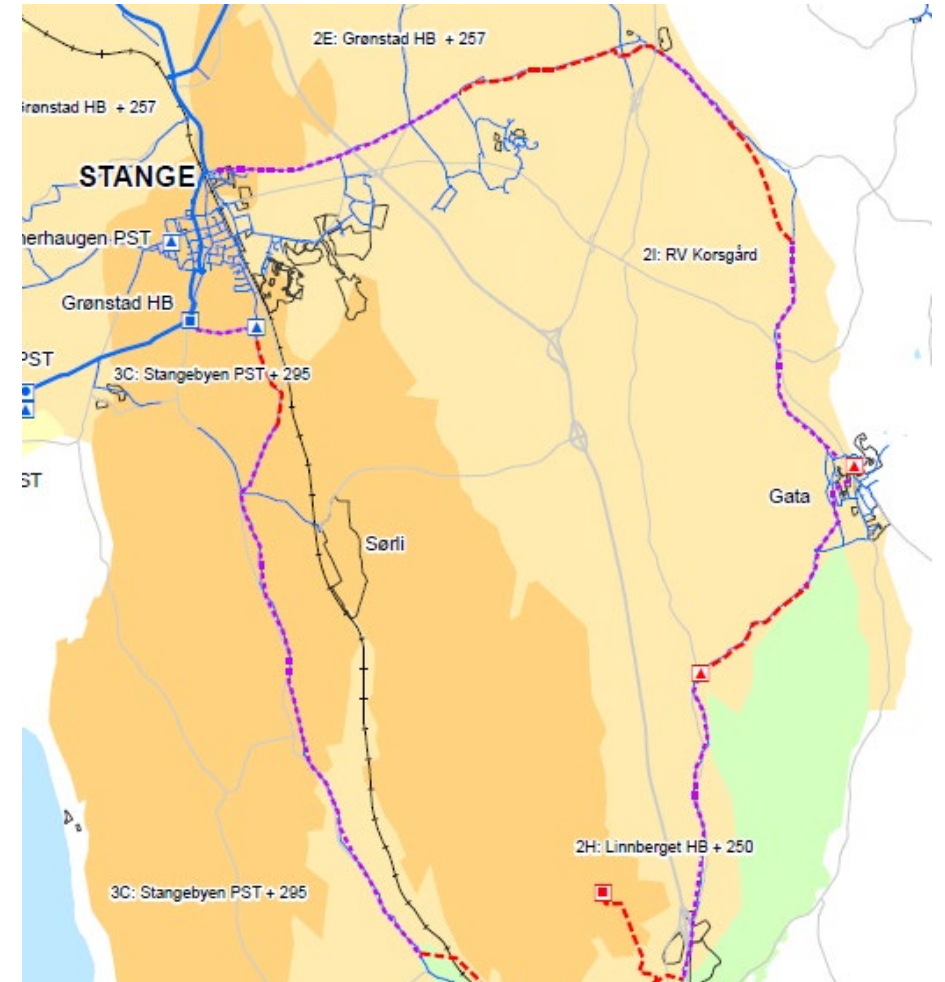

Sanering VA-anlegg Rosenlundvika-Koigen

- Hias og Hamar kommune skal sanere VA og overvann i Storhamargata fra Domkirkeodden til Koigen (se rød strek kart).
- Tiltent oppstart prosjektering 2021 med ferdigstillelse i 2024.
- Hias skal ta over hovedstammen for avløp fra Voll/Lund til Rosenlundvika og nytt avløpssystem må dimensjoneres der etter.
- Budsjett Hias andel: Antatt pr nå 15,3 mill.



Sanering Rudshøgda-dropptank - Avløp

- Fellesprosjekt med Ringsaker kommune
- Prosjektering: I gang med prosjektering men stoppet noe opp pga kapasitetsutfordringer
- Bygging: Usikkert pga kapasitetsutfordringer, men antatt 2023-2024

